Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 02:53:34

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
17	2026	Construção de pronto atendimento municipal – PAM **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 152/2026	300	28/05/2026	R$ 6.245.000,00	3,91%

Nº17/2026
Data Inicial: 28/05/2026

Construção de pronto atendimento municipal – PAM



R$ 6.245.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
45644

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4192	2026	06/07/2026	12249
4412	2026	14/07/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1025	4724	01/07/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
20/09/2027	152/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*6*.8**-29	ART (CREA)	17**2*3**71**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**44**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**44**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*3**03**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001484	R$ 6.278.541,98	15/01/2026	
Contrato	152	2026	76.995.414/0001-60	9001485	R$ 6.245.000,00	27/05/2026	3,91%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001486	Medição	1	Jurisdicionado	04/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2026	1,99%
9001529	Medição	2	Jurisdicionado	06/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2026	2,58%
9001539	Medição	3	Jurisdicionado	16/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2026	3,91%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900291094375					

Nº17/2026
Data Inicial: 28/05/2026

Construção de pronto atendimento municipal – PAM

Documentos



R$ 6.245.000,00

DJI_0173




WhatsApp Image 2026-07-01 at 09.44.51 (1)



WhatsApp Image 2026-07-01 at 09.44.52 (1)



WhatsApp Image 2026-07-01 at 09.44.54

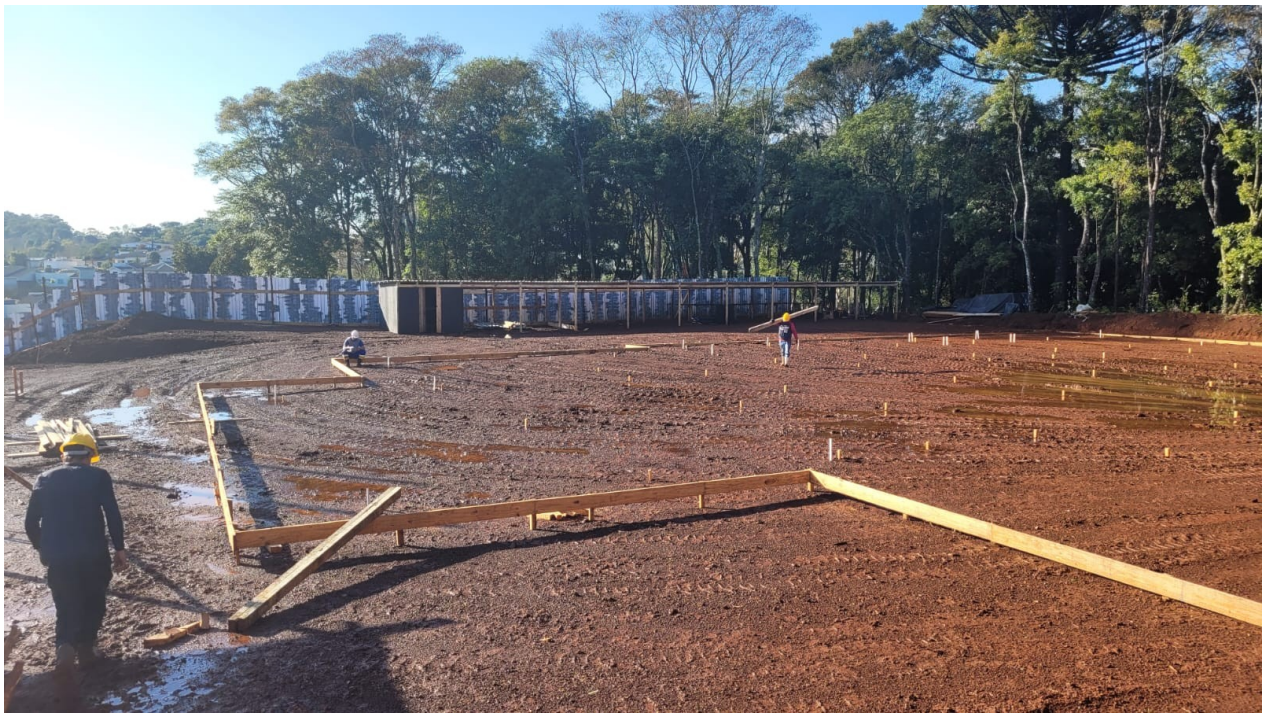

01







04



1







4



5

