Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 02:53:28

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2026	REFORMA RODOVIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UPA **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 145/2026	240	22/05/2026	R$ 1.925.000,00	5,56%

Nº12/2026
Data Inicial: 22/05/2026

REFORMA RODOVIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UPA



R$ 1.925.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
45607

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3493	2026	08/06/2026	12249
5211	2026	25/08/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1025	4724	01/06/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
17/01/2027	145/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**01**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*6**01**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*3**59**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.*0*.4**-97	ART (CREA)	17**2*3**04**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001460	R$ 1.929.529,30	04/02/2026	
Contrato	145	2026	76.995.414/0001-60	9001461	R$ 1.925.000,00	22/05/2026	5,56%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001462	Medição	1	Jurisdicionado	23/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 145/2026	1,60%
9001462	Medição	2	Jurisdicionado	23/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 145/2026	1,60%
9001462	Medição	3	Jurisdicionado	23/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 145/2026	1,60%
9001537	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 145/2026	5,56%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900291124278					

Nº12/2026
Data Inicial: 22/05/2026

REFORMA RODOVIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UPA

Documentos



R$ 1.925.000,00


17/06/2026, 13:29
-25.854541,-52.534363
Rua Coronel Santiago Dantas, 4574
Chopinzinho PR
85560-000

28ac48f1-f276-47d2-a566-320c50267032




2e00a23f-c06b-4587-a7e8-e3c9a057bc61



52ee7eca-f8dd-4a0d-886f-246511b6a85a



542c0b56-1416-499d-b578-3b272ec2ac66

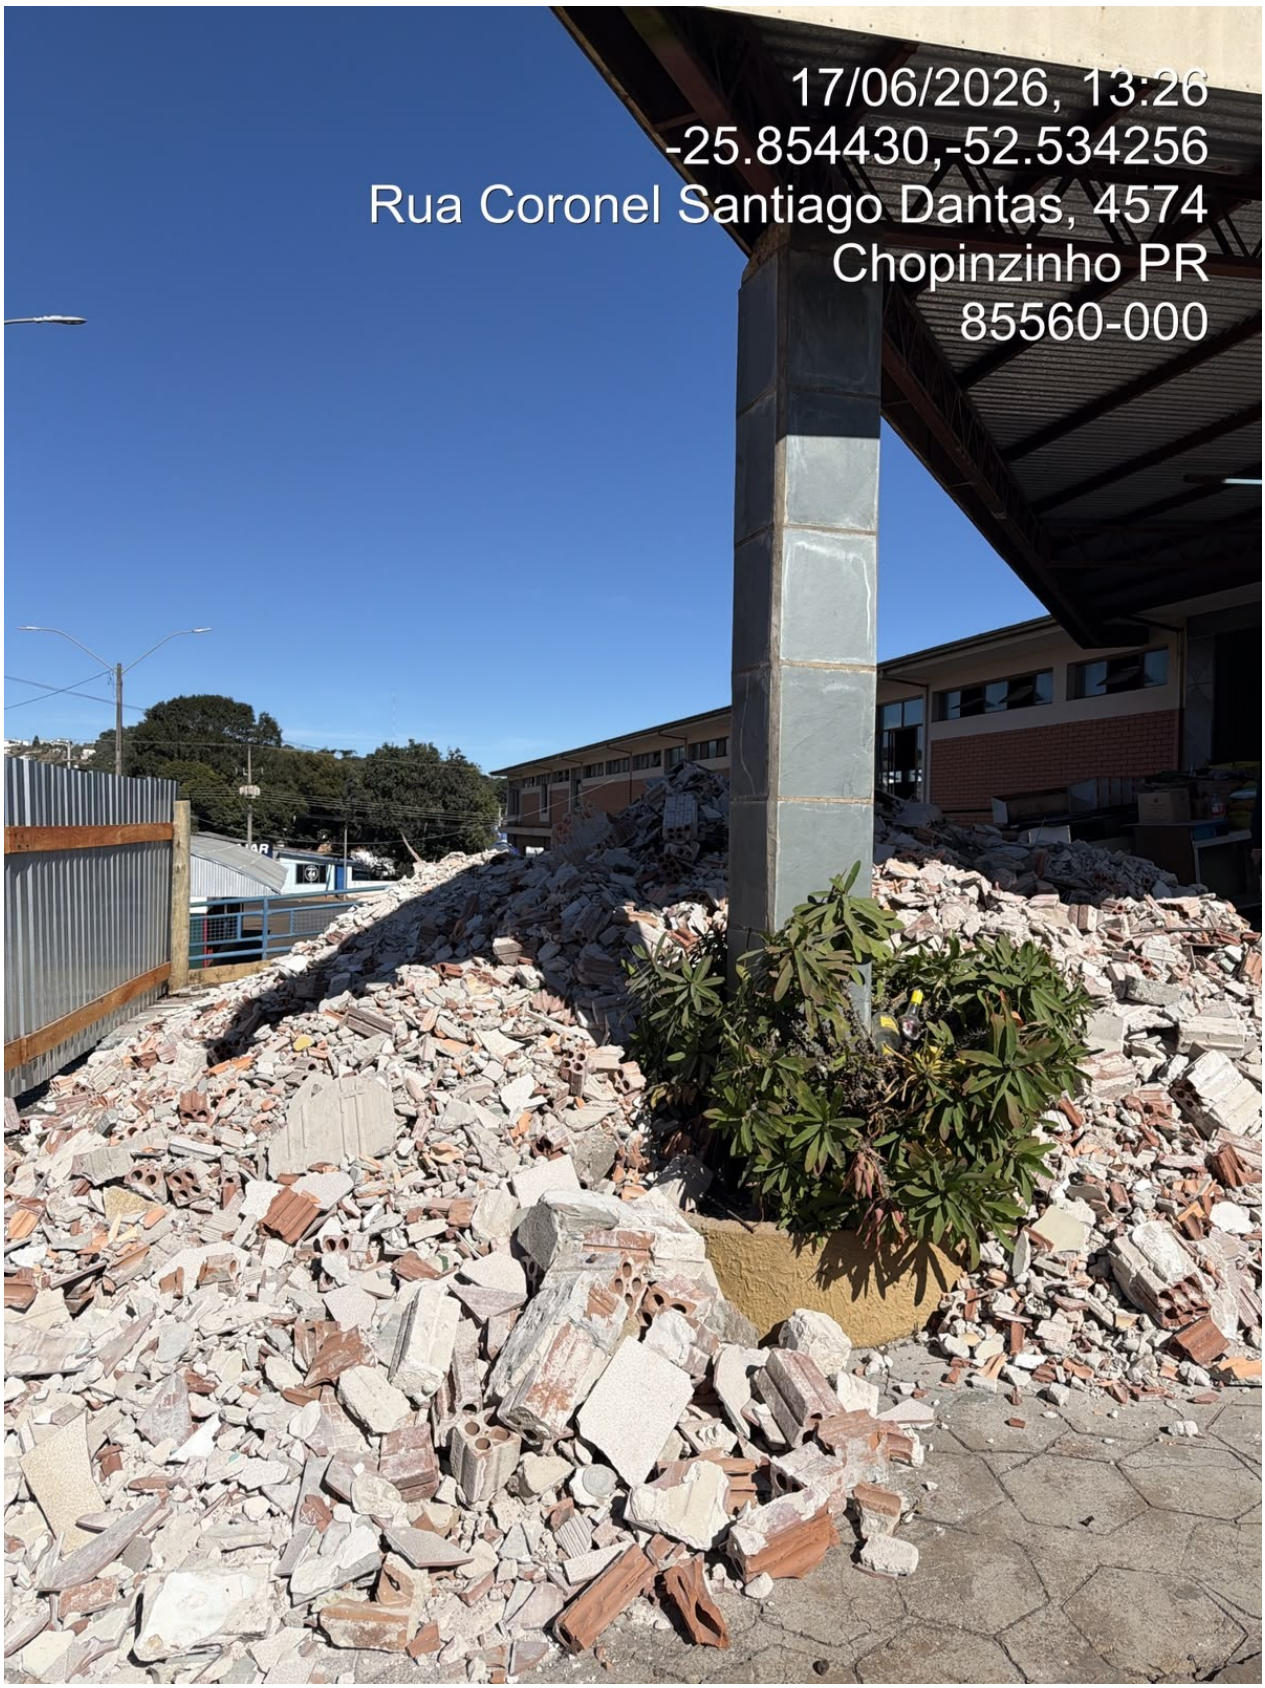

5efb7080-8444-4d02-8400-76618e205e6e



7f1c857f-5b94-4e97-8ac9-c42568b9e8dd





928acc43-c7fb-4a98-9607-4d755161b9cd



984f9ade-a04d-48d0-96c8-7b17dc8b1af2






e28661f9-cccf-44d4-9a3f-e869ec8b9cd6




17/06/2026, 13:29
-25.854701,-52.534358
Rua João Ignácio Thomas, 4237
Chopinzinho PR
85560-000


NO PONTO SUPERMERCADOS
NO PONTO

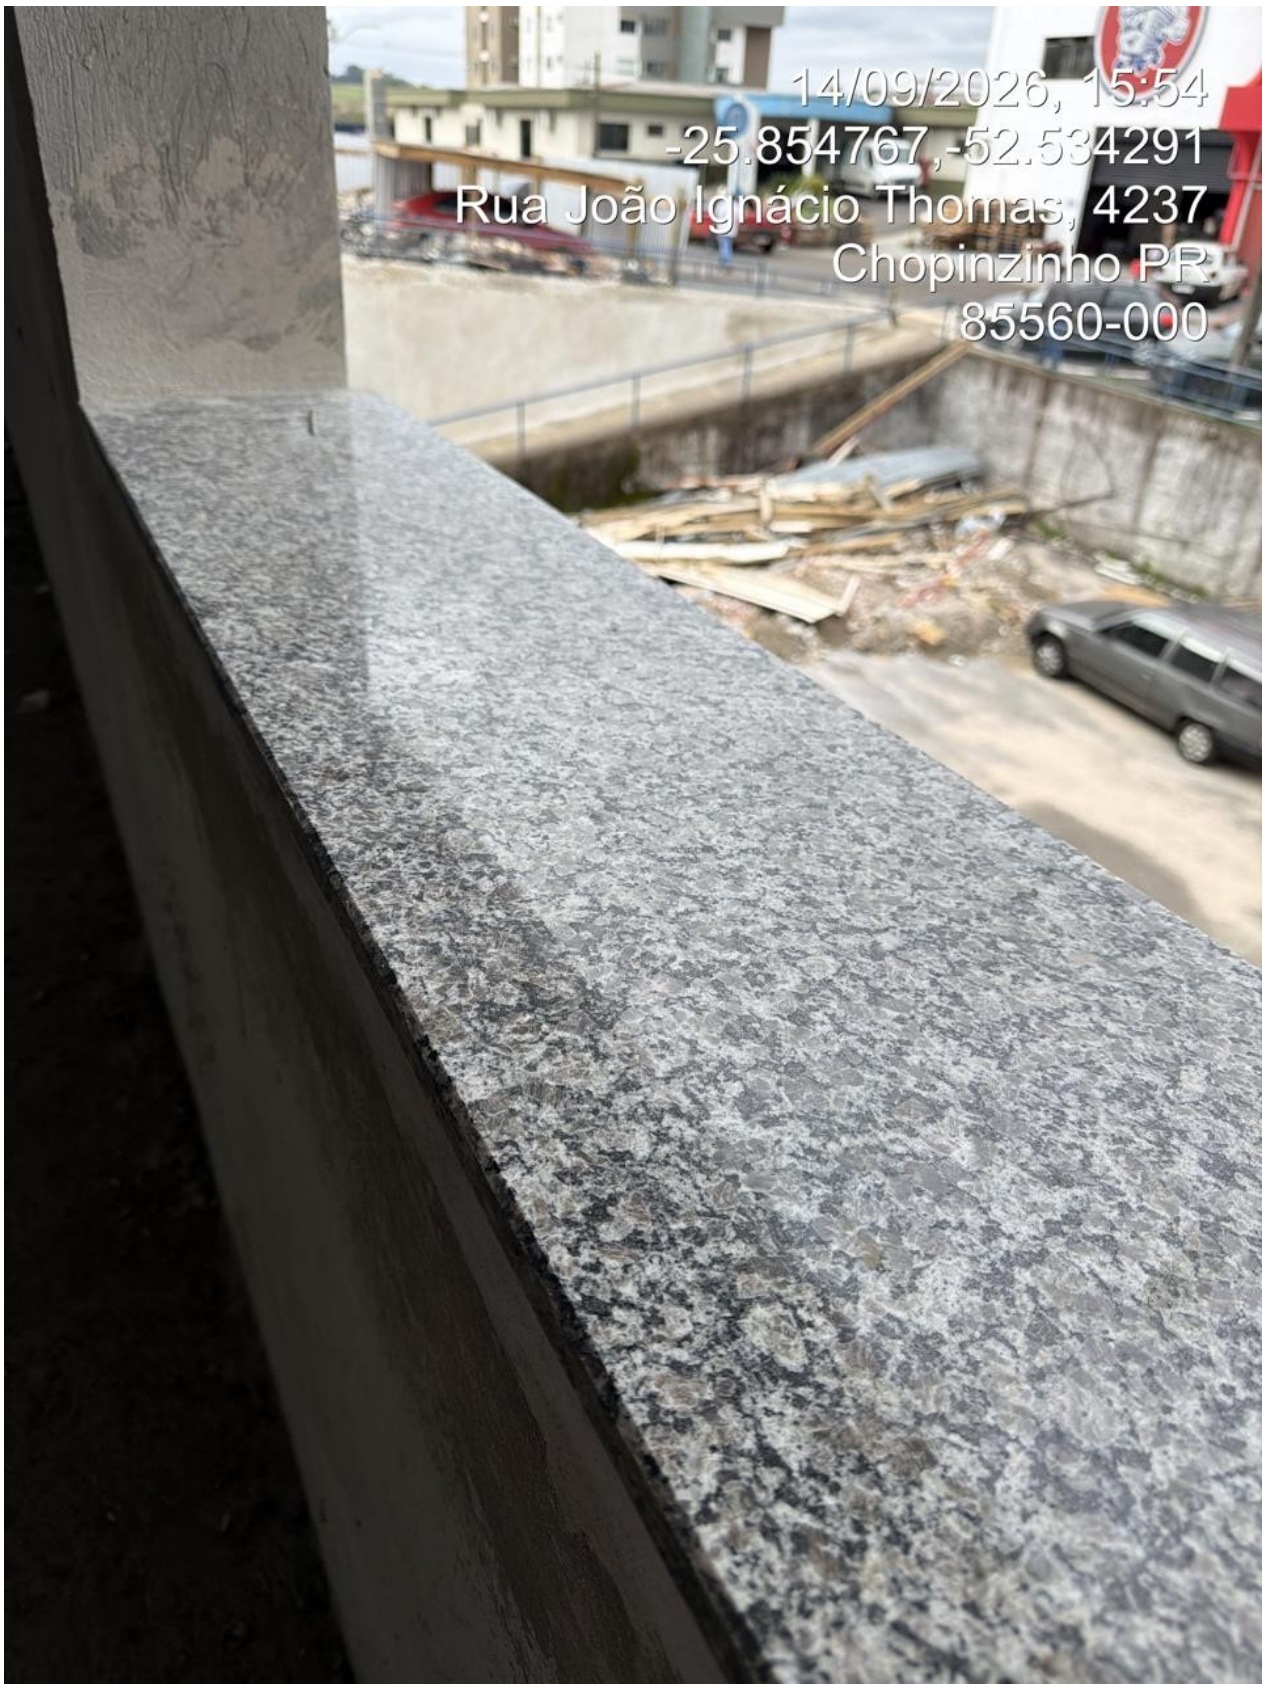
14/09/2026, 15:54
-25.854767,-52.534291
Rua João Ignácio Thomas, 4237
Chopinzinho PR
85560-000

DJI_0504



DJI_0507



DJI_0511

