Grau de Sigilo
 # PÚBLICO

Ofício n°: 11/2026

SULINA, 30 de setembro de 2026

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 6ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1104105-49 - TransfereGOV nº 983416

Objeto: Construção de Unidade Habitacionais
Proponente / Tomador: MUNICIPIO DE SULINA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 6ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	**R$ 2.707.929,11**	**R$ 129.359,51**	**R$ 1.103.844,06**
Contrapartida Financeira:	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
Outros:	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
Investimento:	**R$ 2.707.929,11**	**R$ 129.359,51**	**R$ 1.103.844,06**
Execução Física:	**-**	**4,78%**	**40,76%**

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.
3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no TransfereGOV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Dados: 2026.10.08 08:38:50 -03'00'

GILBERTO JOÃO ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1104105-49	983416	MUNICIPIO DE SULINA	Programa Moradia Digna	GODOIS CONSTRUTORA LTDA	04/2026

Medição: 6 **Período:** 01/09/2026 a 30/09/2026 **% Realizado Período.:** 4,78% **% Realizado Acum.:** 40,76%

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	UH 01	UH 02	UH 03	UH 04	UH 05	UH 06	UH 07	UH 08	UH 09	UH 10	UH 11	UH 12	UH 13	UH 14	UH 15	UH 16	UH 17	UH 18	UH 19	UH 20				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	2	3	3	4	4	5	**6**																
3	FUNDAÇÕES		1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4				
4	PILARES, VIGAS E LAJES		2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5				
5	ALVENARIA/FECHAMENTOS		2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	4	4	5	5	5				
6	ESQUADRIAS METÁLICAS																									
7	ESQUADRIAS DE MADEIRAS																									
8	TELHADOS		5	5	5	5	**6**	**6**	**6**	**6**				**6**												
9	REVESTIMENTOS INTERNOS		**6**	**6**																						
10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS																									
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS		**6**	**6**																						
12	FORROS																									
13	PINTURA																									
14	CERAMICA																									
15	CIMENTADOS																									
16	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS																									
17	ELÉTRICAS / TELEFONICAS																									
18	HIDRÁULICA																									
19	SANITÁRIAS / PLUVIAL																									
20	APARELHOS, METAIS E BANCADAS																									
21	LIMPEZA																									

		Data das Medições											
		30/04/2026	29/05/206	30/06/2026	31/07/2026	31/08/2026	30/09/2026						
Medições		**Medição 1**	**Medição 2**	**Medição 3**	**Medição 4**	**Medição 5**	**Medição 6**	**Medição 7**	**Medição 8**	**Medição 9**	**Medição 10**	**Medição 11**	**Medição 12**
Período:	**%**	5,73%	5,44%	10,67%	8,04%	6,10%	**4,78%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	155.074,41	147.338,61	289.057,39	217.744,06	165.270,08	**129.359,51**	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	**%**	5,73%	11,17%	21,84%	29,88%	35,99%	**40,76%**	40,76%	40,76%	40,76%	40,76%	40,76%	40,76%
	R$	155.074,41	302.413,02	591.470,41	809.214,47	974.484,55	**1.103.844,06**	1.103.844,06	1.103.844,06	1.103.844,06	1.103.844,06	1.103.844,06	1.103.844,06

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global **ração**

SULINA
Local

quarta-feira, 30 de setembro de 2026
Data

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.10.07 12:30:34 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR - 31879/D
ART/RRT: 1720261982927

GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Dados: 2026.10.08 08:38:22 -03'00'

DAISE MARTINAZZO:07280240984
Assinado de forma digital por DAISE MARTINAZZO:07280240984
Dados: 2026.10.06 12:37:35 -03'00'

MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	GODOIS CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº	04/2026
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MORADIA DIGNA EM ALVENARIA CONVENCIONAL COM 47,46 M² DE ÁREA CONSTRUIDA CADA, CONTENDO DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, AREA DE SERVIÇO E VARANDA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITARIAS, HIDRAULICAS, TUDO CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS
MEDIÇÃO Nº	06
DATA DA VISTORIA	30/09/2026
DATA DA MEDIÇÃO	30/09/2026
ENGENHEIRO FISCAL	LUCIANO S. SANTIAGO / CREA: 31879/D
ART FISCALIZAÇÃO	ART: 1720261982927

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO











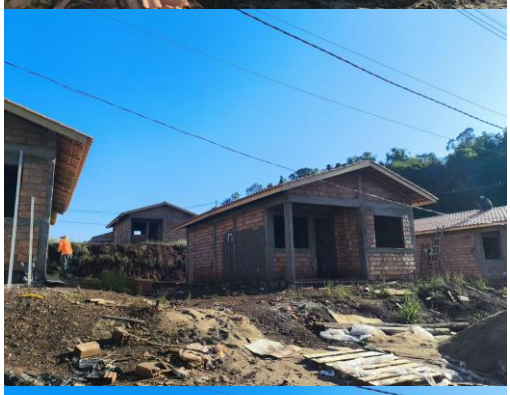














ORTLEV





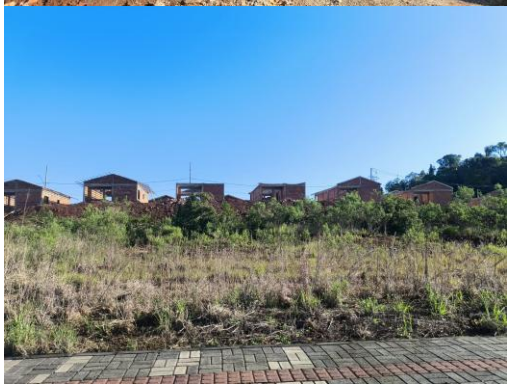



LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.10.08 09:10:45 -03'00'

Luciano S. Santiago
Engenheiro fiscal da obra
